

Время теста 18:07:52

ООО "Борец сервис - Нефтеюганск"

Дата ремонта 06.10.2024

Дата теста 06.10.2024



Протокол тестирования кабельной линии

953


Заказчик

ООО "Газпромнефть-Хантос"


Марка кабельной линии	L общ., (м)	№ барабана	№ кабеля	Принадлежность	Вид сборки	Группа исполнения	Количество сращков, шт
КПвОппБП 130/3*16	2870	230937	ХМ 2410.011	ГПН ХАНТОС	РЕМ+НОВ	1	3

Ток утечки / 20 °С, мкА

А фаза В фаза С фаза

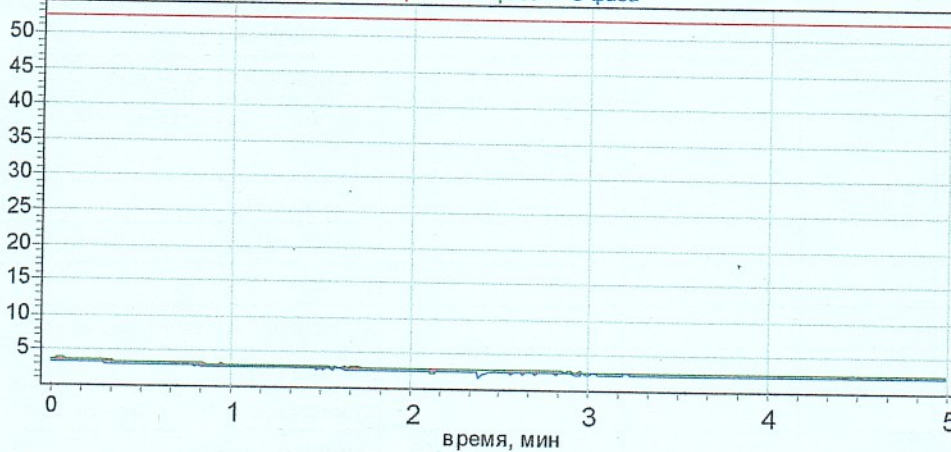

Напряжение, кВ

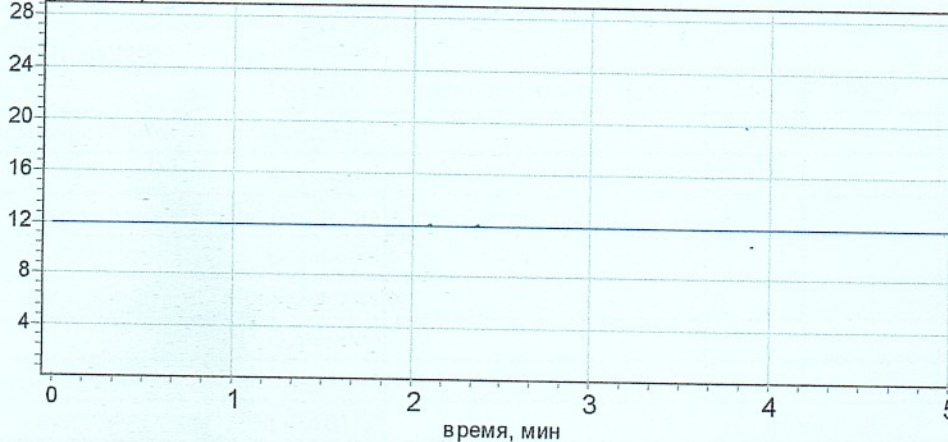

Результаты тестирования

Напряжение теста, кВ	12
----------------------	----

Ток утечки	
Максимально допустимый, мкА	Измеренный, мкА
52,58	(А) = 2,80 (В) = 2,90 (С) = 2,60

Электрическое сопротивление токопроводящих жил	
Идеальное сопр.	2,870
Фактическое сопр.	Отклонение
Фаза А, Ом	2,865 -0,2 %
Фаза В, Ом	2,857 -0,5 %
Фаза С, Ом	2,849 -0,7 %

Порядок чередования фаз	А-В-С
-------------------------	-------

Электрическое сопротивление изоляции / 20 °С, МОм		
Риз (А)	Риз (В)	Риз (С)
13084	15468	11007

Температура, °С	20
-----------------	----

Состав кабельной линии		L, (м)	Опрессовка муфты кабеля			Новый / ремонт	Завод изготовитель
			Опрессовочный агент	Давление, Атм	Время, мин		
Тип муфты удл	УБ 16	25	МАСЛО	10	5	НОВЫИ	ООО "БСН"
Тип кабеля удл	КЕСБП 230/3*16						
№ удлин	K221218161						
			Места ремонта кабельной линии, м				
			Изготовление сростка	Брони	Изоляции		
Вставка №1	КБТ 232/3*16 SELF	597				НОВЫИ	ООО ТЗНПО
Вставка №2							
Основная длина	КПвОппБП 130/3*16	2273				РЕМОНТ	РОССКАТ
Отрезок 1	КПвПпБП-4 130/3*13	903				НОВЫИ	КАВКАЗКАБЕЛЬ
Отрезок 2	КПвОппБП 130/3*16	1370				РЕМОНТ	РОССКАТ
Отрезок 3							
Отрезок 4							
Отрезок 5							
Отрезок 6							
Отрезок 7							
Отрезок 8							
Отрезок 9							
Отрезок 10							
Оператор	ПЧЕЛИНЦЕВ ЮА	Таб. №	1471	Подпись		Тест №	4285
Контролер	БОГУНЕНКО ЛА	Таб. №	174	Подпись		Заключение	Годен
Тестировано на установке		СТ-04 № 03		Примечание			
Программа CableTest_CF		v: 1.6.19.0610					
Режим тестирования		А					
